

濁水溪揚塵抑制

1070920~1070926周報表


- ▶ 本周各測站**PM10**濃度升高，配合環保局各管制區進入緊戒狀態(各區1台灑水車)，並加強三仙膠噴灑、簡易灑水系統灑水等
- ▶ 本周雲林縣政府收集稻草累計進場**561.87**公噸，並加速各裸露地便道打設。

107年度揚塵改善措施第三季執行期程

截至9/26日止

改善措施		本季度			目前進度	辦理機關
		7	8	9		
水利 防制 法	水覆蓋	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
	河道整理	計畫發包		視汛期後灘地變化檢討	已完成發包	四河局
造林 新與 撫育	堤防培厚植栽4公里		完成造林		已完成4.7公里	四河局
防災 應變	稻草	計畫核定及發包	收集稻草	進場鋪設	進場約1000公噸	四河局 農糧署 地方政府
	三仙膠		完成發包	施作	簡易灑水系統4.6公里	四河局 環保署 地方政府
	灑水					
環境清理						

揚塵防治施工報告

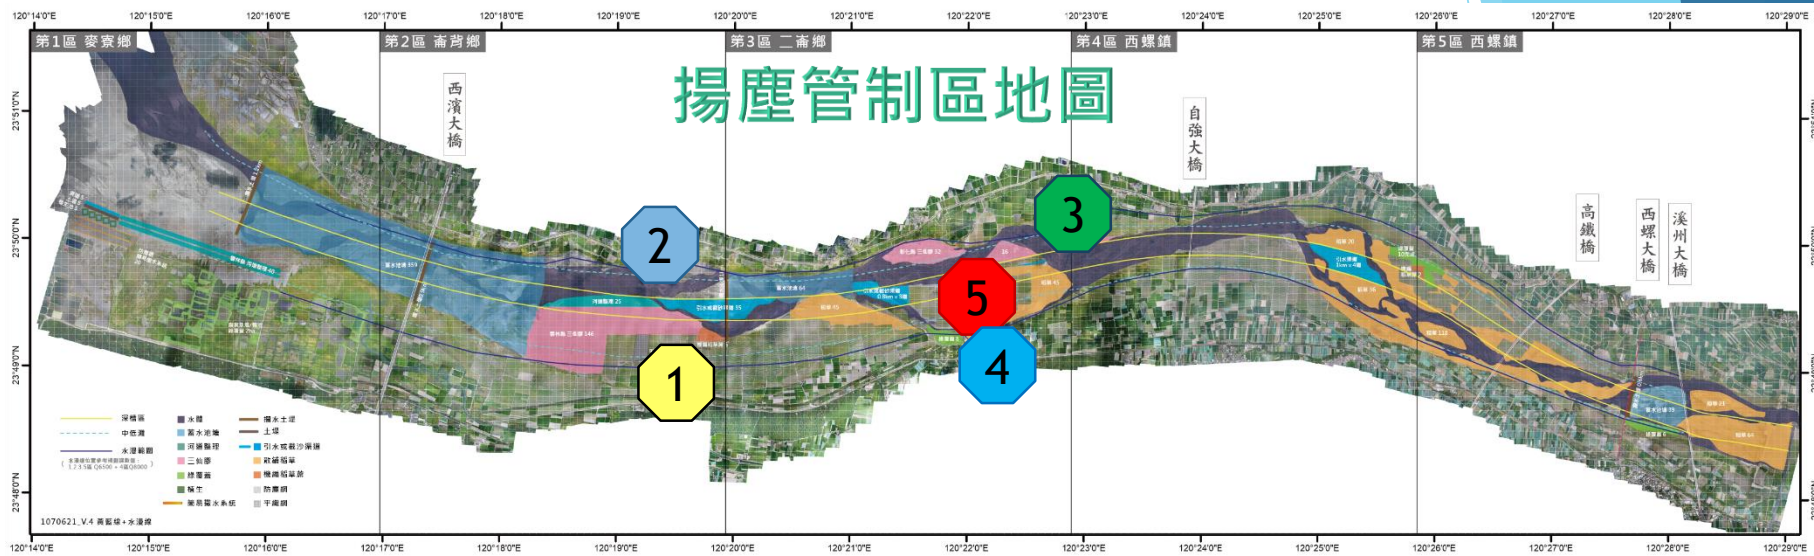

區域	施工位置	施工內容	目前進度
1	大庄堤防	堤前培厚植栽 2公里	完成2.3公里植栽完成
2	下山腳堤防	河道整理及抽砂	去除沙源5.7萬方，場地整理
3	二崙暫置場前	便道打設	機具進場中
4	北岸竹塘	便道打設	便道施作中
5	二崙暫置場	雲林縣稻草收集	進場561公噸，預計進場1085噸

本周揚塵防治工程照片

