

三峽河長福橋上下游整體景觀營造

落實民眾參與-以秀川護岸新設臨時防汛檔板為例

簡 報

簡報機關：經濟部水利署第十河川局



簡報大綱

- 壹、計畫緣由
- 貳、推動民眾參與機制
- 參、落實民眾參與心得
- 肆、結語

壹、計畫緣由-背景說明

- 轉彎河道-受洪水衝擊大
- 河堤不夠高-居民受淹水威脅
- 橡皮壩拆除後-水域環境消失



Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar

壹、計畫緣由-推動沿革

▲ 治理基本計畫 民國81年，公告實施



八張堤防

▲ 八張堤防興建

91年開始陸續興建八張堤防、92年籠埔堤防、93年礁溪堤防下游延長、97~98年八安橋上下游左右岸

▲ 治理基本計畫(第二次修正)

民國100年，公告實施，點出橡皮壩抬昇水位應拆除，秀川護岸高度不足應加高

▲ 101年蘇拉颱風

101/8/25，假三峽公所召開地方說明會提出拆除橡皮壩建議，102年初，橡皮壩拆除，103年初，假祖師廟召開地方說明會提出加高秀川護岸建議，民眾反對改以鋼板封堵

▲ 104年蘇迪勒颱風

104年底，出入口改以活動插版方式封堵

▲ 民眾參與式政策

106年初，展開「三峽河秀川段護岸環境營造規劃」計畫

107年中，推動本計畫
「三峽河長福橋上下游河岸整體景觀營造工程規劃設計」



清水街塌陷



蘇拉颱風淹水



蘇迪勒颱風



活動插版封堵



活動插版封堵

壹、計畫緣由-關鍵問題

➤ 單向施工說明


政府為防洪職掌逕行施工，未考慮民眾感受與需求，以至於民眾對防洪工程產生**不信任感**。

➤ 居民生活不適

居民認為堤防高度過高，妨礙視覺景觀，並影響當地觀光休憩活動，因此**反對護岸加高工程**。

➤ 強烈宗教因素

堤防加高，祖師爺會看不到河川，**無法保祐風調雨順**。

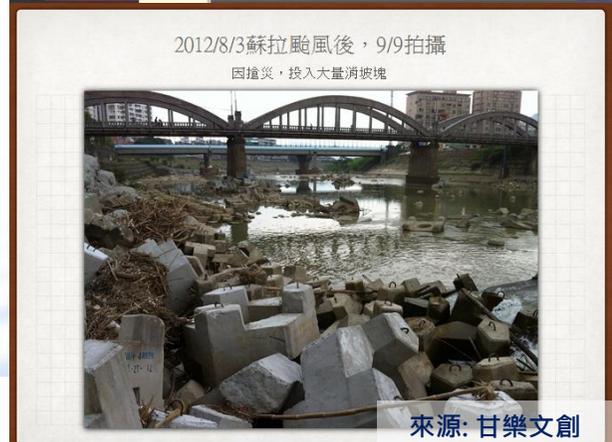

貳、推動民眾參與機制

三峽河秀川段護岸環境營造規劃

12/28
(105)

初步訪談 了解現地淹水情況

3/17
(106)

深入訪談地方頭人 (李楷瑞里長、林炯任老師、林峻丞 執行長 ...)

4/14

偕同十河局承辦 了解地方聲音

4/19

深入訪談 地方居民

4/21

邀請地方居民參與工作坊及訪談

4/27

第一次工作坊 與在地建立良好溝通契機

5/11

與里長討論 內水解決方向與 第二場工作坊內容(十河局、新北市政府)

5/21

第二場工作坊 透過相關基礎知識培力釐清議題

6/12

第一場地方說明會

9/30

第二場地方說明會



反饋成果作為後續
規劃設計基礎



混凝土防洪牆



強化玻璃防洪牆



拆卸式擋水鋼板防洪牆

貳、推動民眾參與機制

三峽河長福橋上下游整體景觀營造




107年10月工作坊



108年3月生態檢核地方說明會

- 7/9~8/17 (107) ● 基本調查-**使用者行為調查**，平假日含夜間，實地走訪調查在地居民及遊客對現況河岸觀感及待改善區位
- 探訪地方里長，意見交流
- 8/20~9/10 ● 工作會議，與里長及民眾現勘
- 10/15 ● 完成基本設計
- 10/31 ● **第一次工作坊** 與地方討論及交流基設成果
- 1/17 (108) ● 完成細部設計
- 2/21 ● **第一場地方說明會** 與地方說明及交流細設成果
臨時性防汛擋板首獲共識
- 3/22 ● **生態檢核地方說明會** (水患治理監督聯盟、新店溪守護聯盟共同參與)
- 4/8 ● 工程發包
- 5/29 ● 里長反應河中沙洲(生態小島)影響景觀，建議清除。本局以**生態優先**保留沙洲，持續與地方溝通說明。

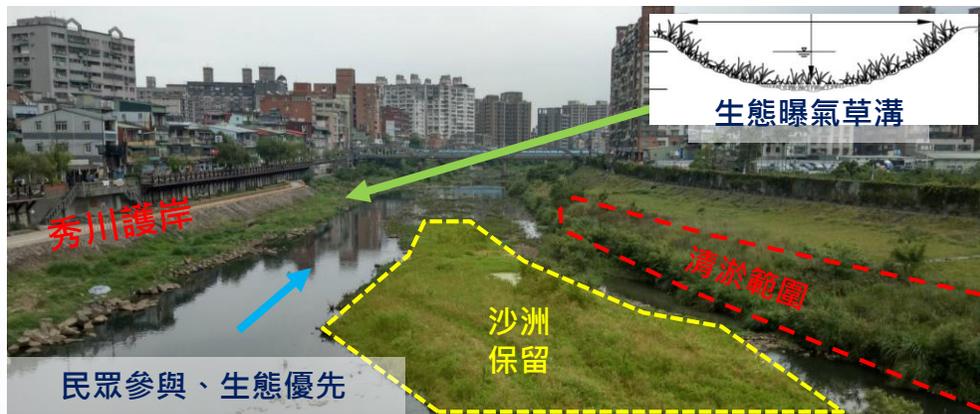

民眾參與、生態優先

「民眾參與」→臨時性防汛擋板→「公私協力」



參、落實民眾參與心得(1/2)

➤ 與民眾溝通

- 研擬溝通策略(細心)
- 循序漸進(耐心)

➤ 注入柔性力量

- 有同理心(傾聽)
- 不爭鋒相對(抗壓)
- 願意去做(接納)

106年三峽河長福橋上下游疏濬工程
總疏濬量 3.4萬方



106年9月地方說明會

話。三峽河



106年6月地方說明會



參、落實民眾參與心得(2/2)

➤ 多元化思維

- 溝通結果去蕪存菁(共學)
- 柔性力量面面俱到(周延)

民眾期待

1. 不要淹水
2. 不要防洪牆
3. 水域營造

運用防洪新科技



檔板基座
施工中情形

三峽特色



保留傳統文化



祖師廟前水域營造及秀川護岸環境改善- 營造自然新環境



now

河川環境 改善



expect

河川環境 營造



wish

河川環境 復原

肆、結語

落實民眾參與 → 建立深厚互信關係
資訊公開透明 → 滿足民眾知的權利

首長視察



順利開工動土



簡報完畢 敬請指教

