

經濟部水利署廠商品質管制規定

八十五年六月二十四日八五水工字第 A850500903 頒布

九十年一月三十日經(九〇)水利工字第 A900500048 號函第一次修訂

九十一年十一月十五日經水工字第 09105005470 號函二次修訂

九十三年十一月二十五日經水工字第 09305006540 號函三次修訂

九十四年五月六日經水工字第 09405002340 號函第四次修訂

九十七年四月二十二日經水工字第 09705003110 號函第五次修訂

九十八年十一月二十三日經水工字第 09805008450 號函第六次修訂

九十九年十月二十二日經水工字第 09905009700 號函第七次修訂

一〇〇年十一月二十一日經水工字第 10005290000 號函第八次修訂

一、經濟部水利署(以下簡稱本署)為提升公共工程施工品質，確保公共工程施工成果，能符合其設計及契約規範之品質要求，並配合行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)頒布公共工程施工品質管理作業要點與相關規定，訂定本規定。

二、實施對象

本署暨所屬機關(以下簡稱機關)所辦理之工程，悉依本規定辦理。

三、為達成工程品質目標，廠商應依工程之特性、契約規定提出品質計畫，建立施工品質管制系統，俾使廠商施工人員熟悉各項品管作業規定，落實品質管制。品質計畫提報規定如下：

- (一) 品質計畫除契約另有規定外，未達查核金額工程，應於工程簽約後十五日內函送監造單位審查；查核金額以上未達巨額金額工程，應於工程簽約後二十日內函送監造單位審查。巨額金額以上工程，應於工程簽約後三十日內函送監造單位審查。
- (二)特殊性質之工作項目於提報品質計畫時，應說明提報分項品質計畫，並於該分項工程施工前三十日函送監造單位審查。
- (三)緊急搶險、搶修、疏濬清淤挖運等工程或經本署同意之工程，無須提報品質計畫，惟必要之檢(試)驗程序，仍應依契約規定辦理。

四、品質計畫之架構可參考工程會品質計畫製作綱要，並依監造計畫、契約規範、施工補充說明書等相關規定製作。

查核金額以上之工程，品質計畫內容應包括計畫範圍、管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等項目。

新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程，品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢

查表、文件紀錄管理系統等項目。

公告金額以上未達新臺幣一千萬元之工程，其品質計畫內容至少應包括計畫範圍、管理責任、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目。

工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準項目。

分項品質計畫內容應包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等項目，得併於分項施工計畫中撰寫；惟遇有變更設計，若涉及材料或工法之變更時，該分項品質計畫應適時配合修訂。

品質計畫紙張規格 A4、標楷體、直式橫書、淺藍色封面裝訂於左邊(詳附件一編製)。其章節內容如下：

(一)計畫範圍

- 1、依據
- 2、工程概要：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員、品管人員及工地主任、工程地點、開工及預定完工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費等。
- 3、工程項目數量表、檢驗項目數量表及監造單位規定之檢驗停留點項目表。
- 4、適用對象
- 5、名詞定義

(二)管理責任

- 1、組織架構：廠商組織架構應含管理階層，包括各部門、專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及工程施工專業主要人員，並檢附相關資格證件影本。
- 2、工作職掌：說明相關部門及人員應辦理之工作內容及重點，明確劃分權責。
- 3、管理審查：為確保品質管理系統能適切及持續有效，應予規劃管理階層對工地之定期審查計畫，以對品質管理系統是否有須改進及變更，進行適時之評估。

(三)施工要領

依契約規定之施工項目，製作各分項工程施工要領一覽表。

- 1、施工機具：施工機具應考慮施工條件，規劃合適施工機具及數量。
- 2、使用材料：施作時所需之材料。

- 3、施工方法、步驟(順序)與流程圖：施作順序應考慮與其他工項之配合，品質檢驗留點應標示於流程中。
- 4、施工注意事項：施作時應考慮或執行之事項、施工經驗或慣例所需施作事項及疏忽或未考慮時，將影響施工安全、品質或施工效率之工作事項等。

(四)品質管理標準

- 1、作業流程：列出分項工程之施工順序。
- 2、管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。
管理標準、檢查頻率之訂定，應依契約規定量化；檢查時機需清楚說明檢查時間點，且對自主檢查時點與檢驗停留點，應作區分；檢查方法則需說明檢驗適用規範。
- 3、管理紀錄：如相關證明文件、施工圖、相片、試驗報告等。

(五)材料設備及施工檢驗程序

- 1、材料設備檢驗程序
 - (1)材料設備選定前之送審流程(如流程圖)。
 - (2)材料設備進料前之管制程序：對於材料設備進料前之管制作業，應建立材料設備(送審)管制總表(表一)。
 - (3)材料設備檢試驗單位之核備程序：材料設備所送試驗單位，應符合本規定第七點規定辦理。
 - (4)材料設備於進場後之管理，如已檢驗與未檢驗材料區隔。
 - (5)材料設備檢驗流程：應含材料設備自主檢查時點、檢驗停留點之訂定及向監造單位申請檢驗程序。
 - (6)材料設備檢(試)驗結果之管制方法：應建立材料設備(檢驗)管制總表(表二)，並訂定相關之缺失改善追蹤機制或管制表單。
- 2、施工檢驗程序：施工檢驗流程，廠商應向監造單位申請檢驗程序。

(六)設備功能運轉檢測程序及標準

- 1、設備功能運轉檢測程序
 - (1)機電系統架構：制定設備功能運轉檢測程序時，應先繪製系統架構圖，以說明零組件、次系統、設備、整體系統間之關聯性。
 - (2)單機設備檢測：所謂單機檢測係指單機製造商依設計圖製造單機，並就該單機作模擬載測試亦為廠驗。為單機設備於裝置前後，能符合契約要求，依設備性能，訂定測試計

畫(包括測試項目、時機、程序、方法及使用表單等)。內容說明如下：

- A、設備進場前對設備製造廠商應配合之檢驗作業，包括各相關出廠證明、測試報告、施工組裝圖說等。
- B、單機設備之測試項目，應依契約規定及工程設備屬性訂定，如試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試等。

(3)系統運轉檢測：所謂系統檢測係指各項單機於工地現場組(安)裝後(含管路、電氣、儀控、監測等全套系統設備裝配完成)，所作之檢測亦為空載測試或稱無水測試。依其設備性質，應訂定系統運轉測試計畫及程序。內容應包括下列各項：

- A、完整之系統分類及系統組合測試計畫與組合之個別檢測程序。
- B、個別系統之獨立功能性運轉測試及完整測試程序。
- C、系統清理及排放檢測程序、相關測試紀錄或應用表單附件及使用方法。

(4)整體功能試運轉檢測：所謂整體功能運轉檢測係指各項單機組(安)裝完成後，所作整體功能介面之整合運轉測試，亦為有載測試或稱通水測試。為裝置完成後，對整體內各系統之相互連結、啟動、運轉與操控能正常運作，依設備之性能，訂定相關測試計畫。內容說明如下：

- A、訂定整體功能試運轉測試計畫
 - (a)個別系統測試完成或整體設備與他項工程介面連結後之系統功能運轉測試流程，並條列測試項目及重點。
 - (b)試運轉或全程操作應注意事項(含供電方式及其穩定性檢討)。
- B、實施整體系統連結整合測試，所應提交監造單位之測試紀錄、報告，包括下列各項：
 - (a)全程操作及調整紀錄。
 - (b)功能異常時之檢測報告書。
 - (c)完整之試運轉報告書。
 - (d)各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。
 - (e)試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。

2、設備功能運轉檢測標準

對於各項設備功能運轉之檢驗，依所訂定之單機、系統及設備

整體組設完成後，與他項工程介面連結之整體功能運轉檢測程序及檢測項目，分別訂定應達到契約所訂之標準。

(七)自主檢查表

依契約規定之重要施工項目，訂定各分項工程自主檢查表一覽表。

1、對於各項工程施工自主檢查項目之成果，應彙整成自主檢查成果統計總表(表三)。

2、自主檢查表內容，應包括檢查日期、位置(如樁號、高程)、檢查項目、檢查標準含標準值及檢測(查)之量化值、檢查結果之記錄，表下有工地主任、現場施工人員(檢查人員)簽名欄位(表三之一)。

4、自主檢查表之執行

(1)執行人員及時機：各分項自主檢查建檔時，應有分項施工作業自主檢查紀錄表，自主檢查係由現場施工人員執行，檢查完畢後簽名。

(2)不符合情形之處置及管制方式。

(八)不合格品之管制

1、對施工材料設備經現場檢驗不合格或抽樣試驗結果不合格情形之處理方式，及暫存方式(合格、不合格品應於現場區隔標示暫存)。

2、不合格品後續處置之追蹤管制及管制表格。

3、對材料及設備不合格率異常時、缺失頻率高之項目之管制方式，及如何與矯正、預防措施作連結。

(九)矯正與預防措施

1、矯正措施

(1)矯正作業辦理時機之訂定(如依缺失發生之頻率、缺失之嚴重性等)。

(2)矯正措施執行之流程：有效處理不符合事項缺失之報告，並決定矯正措施，以消除潛在不符合之原因。

(3)矯正結果之紀錄。

(4)矯正措施成效之評估方法，以持續改進品質管理系統之有效性。

2、預防措施

(1)採行預防措施之時機。

(2)預防措施之執行流程。

(3)所採行措施之結果紀錄。

(4)預防措施成效之評估方法。

(十) 內部品質稽核

1、品質稽核權責：說明品管人員(或品管部門)執行內部品質稽核之權責。

2、品質稽核範圍

品質稽核為一項內部系統化及獨立性的查驗，以判定工地執行之各項品質活動是否有效落實執行。稽核範圍至少應包括下列各項：

(1)對於工地之各項計畫、施工要領、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。

(2)透過文件及紀錄稽核執行工作者，是否依據作業流程執行；查證執行工作成果，符合作業紀錄且品質無虞。

(3)對於不符合事項及矯正、預防措施之處理與各類文件、紀錄歸檔是否確實。

3、品質稽核頻率：視工程規模並結合趕工計畫實施，擬訂稽核時程計畫表，如查核金額以上之工程，至少每月二次；未達查核金額之工程，至少每月一次。

4、品質稽核流程：包含內部品質稽核結果通知(表四之一)、結案、矯正措施等分別予以說明，應含相關表單及附件(如改善前、中、後照片)，並建立內部品質稽核管制總表(表四)。

(十一) 文件紀錄管理系統

1、文件及記錄管理：

(1)對於與本工程有相關文件項目，詳予表列(如：公文書信、契約、計畫、各項空白表格等)並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定、保存、作廢等作業程序及存放管理方式。

(2)規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定(權責劃分)保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等(如：各項查驗紀錄、會議紀錄、日報表、施工照片、自主檢查等)，將紀錄成果作有系統之歸檔。

(3)隱蔽部分應輔以施工照片紀錄，以利查證。

2、紀錄轉移及存檔

(1)工程完工後，對紀錄資料移轉予業主之項目及程序作規劃。

(2)規劃文件最終之存檔位置及存檔年限。

五、品管人員

凡編列有品質管制作業費項下行政作業費之工程，應設置品管人員。

(一)品管人員資格

- 1、未達查核金額之工程，品管人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。
- 2、查核金額以上之工程，品管人員除應符合前款規定外，其學歷須應與工程屬性相關科系畢業者。
- 3、依據工程會頒布公共工程品質管理人員回訓大綱之規定，品管人員取得前開結業證書逾四年者，應再取得最近四年內三十六小時之回訓證明，始得擔任品管人員。
- 4、品管人員不得為工程會資訊網路系統登錄公告品質不良被撤換之人。但於登錄公告次月起滿二年後，再取得九十小時之品管回訓證明者，不在此限。

(二)品管人員工作重點

品管人員應實際於工地執行品管，其工作重點如下：

- 1、依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規、參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。
- 2、執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
- 3、材料設備及施工品質檢(試)驗報告試驗成果之判定及簽章。
- 4、品管統計分析(如混凝土圓柱試體)、工程查核與督導之施工品質缺失矯正與預防措施之提出及追蹤改善。
- 5、材料、設備及施工品質文件、紀錄之管理。
- 6、品質成果報告書編製。
- 7、其他提升工程品質事宜。

(三)品管人員報核、異動與解除規定

- 1、廠商應於開工前，將品管人員登錄表(表五)、品管人員學經歷登錄表(表六)及資格證明文件影本函報機關審查；品管人員異動時，亦同。
- 2、廠商申報竣工後，向機關申請解除品管人員職務；如機關認為品管工作尚未完成時，得延緩解除品管職務。
- 3、增設之品管人員於工作項目完成後，經機關認可得予解除職務。

(四)品管人員人數規定

各標案商品管人員應專任，不得跨越其他標案，且施工時應在工地執行職務，最低人數規定如下：

- 1、依該標案採購金額規定辦理：

(1)巨額採購以上之工程：

a、土木工程標案，應設相關土木類等專長至少二人，如

含有機械、電機等工作項目者，應增設相關機械、電機類等專長至少一人；

b、機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少二人，如含有土木工作項目者，應增設相關土木類等專長至少一人。

(2)查核金額以上未達巨額採購之工程：

a、土木工程標案，應設相關土木類等專長至少一人，如含有機械、電機等工作項目者，應增設相關機械、電機類等專長至少一人；

b、機械、電機等標案，應設機械、電機類等專長至少一人，如含有土木工作項目者，應增設相關土木類等專長至少一人。

(3)未達查核金額之工程，至少設置一人。

2、工程開工後，廠商應依據工地現況、工程性質及施工期限，妥善規劃工程施工及品管人員配置，惟如工程施工期間品管人員不敷需求時，廠商應自行增加品管人員以因應實際需要，增加品管人員所需費用由廠商自行負擔，機關不另給價。

(五)機關發現品管人員有下列情事之一者，廠商應於機關通知文到十四日內完成更換品管人員作業；機關並於工程會標案管理資訊網路系統登錄該品管人員為品質不良被撤換。

- 1、未實際於工地執行品管工作。
- 2、未能確實執行品管工作重點或為不實紀錄者。
- 3、工程施工查核、工程督導等列為丙等。
- 4、工程查核或督導未能有效提出改善方法、未依機關指定期限內完成改善，經再通知後仍未能完成者。

六、專任工程人員

(一)依據營造業法第三十五條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決或指導施工技術及安全措施等問題；於工程查驗、查核或督導時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。

(二)督察品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填寫廠商專任工程人員督察紀錄表(表七)及實施追蹤管制(表八)。

(三)專任工程人員至工地現場指導施工技術及安全措施等問題時，應留下標示日期之佐證相片備查。

七、材料設備、施工品質之檢驗及施工作業之檢驗規定

(一)測試實驗室

- 1、各項工程使用材料設備及施工品質之檢驗或抽驗項目，應由符合 CNS 17025(ISO/IEC 17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告。檢(試)驗報告，應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌 TAF Logo(標誌)。
- 2、材料送驗之實驗室須經機關同意後辦理；例外檢(試)驗項目，因無該項目認證實驗室、距離遙遠或情況特殊影響施工者，經執行機關同意後送機關認可之實驗室。
- 3、行政院公共工程委員會規定下列國際相互承認之材料試驗認證項目，不得以前款之例外排除：
 - (1)混凝土圓柱試體抗壓強度試驗。
 - (2)混凝土鑽心試體抗壓強度試驗。
 - (3)瀝青鋪面混合料壓實試體之厚度或高度試驗。
 - (4)瀝青混凝土之粒料篩分析試驗。
 - (5)熱拌瀝青混合料之瀝青含量試驗。
 - (6)瀝青混合料壓實試體之比重及密度試驗(飽和面乾法)。
 - (7)鋼筋混凝土用鋼筋試驗。
 - (8)水硬性水泥墁料抗壓強度試驗。
 - (9)水泥混凝土粗細粒料篩分析。
 - (10)水泥混凝土粗細粒料比重及吸水率試驗。
 - (11)土壤夯實試驗。
 - (12)土壤工地密度試驗。
 - (13)可控制低強度回填材料(CLSM)抗壓強度試驗。(自民國一百零一年一月一日起)
 - (14)瀝青混凝土壓實試驗。(自民國一百零一年一月一日起)
 - (15)鋼筋續接器試驗。(自民國一百零一年一月一日起)
 - (16)高壓混擬土地磚試驗(至少含 CNS13295 之 6.1 外觀檢驗、6.3 尺度及許可差量測、6.3 抗壓強度試驗及 6.4 吸水率試驗等四項)。(自民國一百零一年一月一日起)
 - (17)普通磚試驗。(自民國一百零一年一月一日起)

(二)工程使用之材料及設備進場時，卸料檢驗說明如下：

廠商工程使用之材料及設備進場時，應提送出廠證明、檢(試)驗合格文件等資料，經監造單位審查核可後始准卸料。

- 1、涉及契約圖說及施工規範等約定檢驗部分，廠商需依規定頻率向監造單位提出申請，並會同辦理材料取樣、簽名、送驗及會驗。
- 2、若為材料進場之廠商自主品管檢驗部分，由廠商自行取樣、

送驗後檢驗記錄應建檔備查。

3、廠商應於施工到達檢驗停留點前，備妥相關文件資料並填具檢驗申請表(表九)，向監造單位提出申請檢驗並配合辦理。檢驗停留點未經監造單位檢驗合格，不得進行下一階段之施工。

4、廠商應保留相關材料設備進場之送貨單備查。

(三)檢驗報告判讀規定

1、除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者，由監造單位自行判讀，不需施工廠商品管人員初判；屬施工廠商依契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者，則由施工廠商品管人員初判，再由監造單位複判。

2、檢驗報告應加蓋判定戳章(詳附件二製作)，並註明『本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事上所有責任』，判讀程序完成後分別由監造與廠商作文件管理。

八、依採購法第 70 條規定對於重點項目訂定之檢查程序及檢驗標準，依本工程監造計畫書之檢驗停留點及品質管理標準辦理。

九、辦理之各項查核、督導、內部品質稽核、檢驗、自主檢驗及自主檢查等，如有不符合事項或潛在不符合因素，廠商應依不符合事項處理流程(圖一)辦理，確實落實不符合事項處理作業，並採取不符合事項報告(表十)之矯正預防措施及實施不符合事項報告追蹤管制表(表十一)。

廠商應隨時於工程會網站 <http://www.pcc.gov.tw>，網頁下『品質管理/品質查核/工程品質常見缺失說明』瞭解缺失發生原因，避免缺失發生。

十、品質檢驗不合格，依下列規定辦理

(一)品質檢驗不合格，依規定辦理再驗者，再驗之一切費用概由廠商負擔。

(二)品質檢驗不合格之構造物，經拆除重作後，應再作檢驗，其一切費用概由廠商負擔。拆除重作應檢附拆除前、中、後同角度拍攝之照片，與檢驗紀錄及相關之資料。

十一、「品質管制作業費」分別包含「品管事務費」與「檢驗費」等項目，項目內容說明如下：

(一)「品管事務費」項目：包含品管人員、品質管制、自主檢查、自

主檢驗、文件紀錄、資料建檔、品質計畫、品質成果報告書、製作模型樣品與其他相關品管作業等費用。

(二)「檢驗費」項目：包含材料設備與施工品質之材料、取樣、交通工具、材料、試驗、人員、相關配合作業及其他相關費用等。

十二、工程施工查核或工程督導

(一)機關及其上級主管機關查核、督導施工情形，得進行施工品質查驗，與工程司所進行之一切驗證或檢驗，廠商應充分配合。發現缺失時，廠商應分析缺失發生原因，立即採取改善及矯正預防措施，並將改善結果依指定期限報機關備查。

(二)接獲查核、督導通知時，廠商應備妥契約書、品質計畫、施工計畫及品管成果等資料；另專任工程人員、品管人員、工地主任(工地負責人)及勞工安全衛生管理人員等，均應於查核、督導時列席接受詢問說明業務執行情形。

十三、進場之材料設備或施工品質

(一)監造工程司對進場之材料設備或施工品質有質疑或需要(委外監造者應經主辦機關同意)，得隨時要求廠商配合辦理契約規定以外之查驗、測試、試驗或檢驗，其結果不符合契約規定者，除依契約規定辦理外，並由廠商負擔試驗費用及所衍生之費用；結果符合者，由機關負擔試驗費用。

(二)廠商不得因材料設備或施工品質曾通過其他查驗、測試或檢驗，而拒絕機關查驗、測試、試驗或檢驗。

十四、工程品質成果報告

(一)廠商應於報竣工日起二十八日內提報品質成果報告二份送執行機關審核(詳附件三編製)後，非授權工程者執行機關檢具一份送署備查，逾期提報者依本規定之罰則辦理。

(二)品質成果報告紙張規格A4、標楷體、直式橫書、黃色封面裝訂於左邊，目錄及檢核表，各章節加色紙間隔。

十五、廠商應注意及配合辦理事項

(一)本工程合約、圖說、施工說明書等合約內有關規範規定之廠商提供各項文件，如品質計畫、品質成果報告、報表、試驗報告、自主檢查表、分段查驗報告等證明文件，廠商之負責人、專任工程人員、品管人員、工地主任等依文件屬性及權責等簽名或用印。

(二)廠商應逐日填寫施工日誌，將當日施工範圍、數量、取樣位置(

樁號、高程)、取樣數量、試驗結果、通知協力廠商辦理事項、監造單位指示辦理事項及其他重要項目等詳實記載，施工日誌並隨時供機關督導或查核；其施工日誌格式製訂，請參考工程會之施工日誌格式。

十六、違反本規定導致延誤工期時，廠商不得以此要求展延工期。

十七、罰則

(一)廠商有下列之情事之一者，機關應暫停發放工程估驗款：

- 1、廠商未依規定期限提出品質計畫；或未於期限內修正提報者。
- 2、每期辦理工程估驗，廠商未檢附該期材料設備出廠證明文件、經監造單位判定合格之檢驗報告等相關資料者，及進度達百分之二十五、百分之五十、百分之七十五與百分之一百時未檢附自主檢查表者。
- 3、違反第五點品管人員之規定者。
- 4、違反第六點專任工程人員之規定者。
- 5、實施工程施工查核或機關及其上級機關人員實施工程督導，如發現有缺失，廠商未於通知期限內將改善情形報監造單位者。

(二)施工品質嚴重缺失，可歸責於廠商者，應依下列規定對廠商辦理懲罰性違約金事宜：

- 1、經施工查核小組或工程督導小組依工程施工查核小組查核品質缺失扣點表之扣點範圍內，認定有施工品質缺失，應予扣點。
- 2、於施工查核或工程督導時，廠商專任工程人員、品管人員、工地主任、勞工安全衛生管理人員等，未經機關同意，無故未到場說明者，每人員每次罰扣點數一點。
- 3、上級機關工程施工查核小組查核結果，成績列為丙等且可歸責於廠商者，除依本契約之懲罰性違約金相關規定及工程施工查核小組作業辦法規定辦理外，另扣罰本工程品管事務費之百分之十。
- 4、廠商逾期提送品質計畫書或品質成果報告書，應處以懲罰性違約金，每逾期五天為一期，未滿五天以一期計，每期應扣點數一點；逾期修正亦同。
- 5、工程查核、工程督導、監造單位等發現缺失開立不符合事項報告之缺失改善，未經同意展期而逾期，每逾期二天為一期，未滿二天以一期計，每期應扣點數一點。

- 6、品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額之百分之二十為上限；經查核或督導評分未達七十分者，應依行政院公共工程委員會頒布之施工查核作業辦法或本署頒布之工程督導作業要點規定辦理。
- 7、懲罰性違約金金額，依行政院公共工程委員會規定每點罰款為新台幣四仟元。
- 8、請領末期款前，廠商仍未履行繳納罰款責任，由機關自其未領款項內扣除。

(三)廠商品質成果報告書，各項試驗紀錄總表所列之實際檢(試)驗次數少於竣工結算數量應作之檢驗次數時，除契約另有規定外，如已包覆、埋置、無法再檢驗者。所有未辦理檢驗之工程材料，廠商應出具由專任工程人員(技師)簽名之安全切結書(含結構計算)保證結構之安全，並依契約相關規定辦理。若經判定結構有不安全之虞者應拆除重作，其一切費用及工期均由廠商負責，並依契約相關規定辦理。

無出廠證明或生產工廠之檢(試)驗報告足以證明該部份材料其規格及材質符合本工程設計需求者，應辦理相關檢驗。

(四)工程施工查核或督導評分未達七十分者，查核或督導有施工品質不良或其他違反本規定之情事且情節重大者，機關得依契約規定暫停發放工程估驗款，直到改善完成為止。

(五)偽造不實之學經歷證明文件、檢驗報告、試驗試體、出廠證明或其他相關造假不實之文件等，除需負法律責任外，並得依政府採購法第一百零一條至第一百零三條規定處理。

(六)廠商施工與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵情事，除依契約相關規定予以處置外，機關並依照營造業法第六十一條、第六十二條；技師法第四十一條；建築師法第四十六條、政府採購法第一百零一條至第一百零三條等相關規定追究責任。

表一

(○○工程)材料設備(送審)管制總表

編碼：

項次	材料(設備) 名稱	供料 廠商	使用 位置	送審資料(√)							備註 (歸檔 編號)	
				預定 送審 日期	審查 日期	材料 規範	試驗 報告	供應 廠證明文 件	出廠 證明	樣品	審查 結果	
	契約 數量			實際 送審 日期	審查 人員							

表二

(○○工程)材料設備(檢驗)管制總表

編碼：

項次	材料(設備) 名稱	送審情形				備料 時間	進料時間		材料進場及檢查情形					備註	
		預定期 日期	實際日期	核定日期			預定期 日期	實際日期	檢驗標準	檢驗項目	檢驗頻率	進場 數量	抽樣 數量		
	契約 數量											累積進 場數量	累積抽 樣數量		

表三

自主檢查成果統計總表

統計日期：

工程名稱：

項次	施工作業抽查項目	抽查次數	符合次數	不符合次數	備註

表三之一

○○○施工自主檢查紀錄表

編碼：

工程名稱			
承攬廠商			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格	<input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正	<input type="checkbox"/> 無此檢查項目
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	檢查標準 (敘述檢查值)	檢查結果
缺失複查結果：	<input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善		
複查日期： 年 月 日			
複查人員職稱：	簽名：		
備註：	1. 檢查標準及實際情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm-10mm)。 2. 檢查結果合格者註明○，不合格者註明×，如無須檢查之項目，則打\。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具缺失改善追蹤表進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。		

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：

表四

內部品質稽核管制總表

統計日期：

工程名稱：

項次	編碼	稽核項目	稽核 次數	符合 次數	不符合 次數	備註
1		施工設備、材料設備				
2		施工圖表、品質管理標準				
3		自主檢查				
4		材料檢驗報告、出廠證明				
5		文件、紀錄				
6		執行成果是否符合作業紀錄				

表四之一

內部品質稽核結果通知單

編碼：

工程名稱	稽核日期	年 月 日
品管人員		
稽核項目類別	<input type="checkbox"/> 1 施工材料設備 <input type="checkbox"/> 2 施工圖表 <input type="checkbox"/> 3 自主檢查 <input type="checkbox"/> 4 檢驗報告 <input type="checkbox"/> 5 文件、紀錄	
缺失事項分類	<input type="checkbox"/> 1. 主要缺失事項 <input type="checkbox"/> 2. 次要缺失事項 <input type="checkbox"/> 3. 觀察事項	
稽核事項說明		
稽核事項(品管人員填寫)	限期改善完成日期：	
現場工程師：		
矯正及預防措施情形說明		
矯正措施(現場工程師填寫)		
預防措施(現場工程師填寫)		
現場工程師：		改善完成日期：
審查結果		
需改善追蹤行動內容：		
品管人員：		預定追蹤日期：
<input type="checkbox"/> 同意結案		
結案日期：	品管人員：	

表五

品管人員登錄表

工程標案 名稱				工程案號 電腦編號		
工程點		開工日		預計 完工日期		
決標金額	(千元)	品管費用	(千元)	工地聯絡電話		
工程 主辦單位				承辦人	姓名	
					電話	
監造單位				廠商		
品 管 人 員	姓名	專長	身分證字號	受訓期別	進駐本工 地日期	回訓 期別
請勾選 一項	<input type="checkbox"/> 第一次登錄 <input type="checkbox"/> 品管人員異動					
備註	<p>一、專長欄須填寫與本工程工作性質及學經歷相符之專長，如建築、土木、機電、環工等。</p> <p>二、第一次登錄品管人員須檢附下列資料（紙張一律採用 A4 規格）函報監造單位審查、經機關核定後，並由機關登錄於網站。</p> <p>(1)本表（表3）。</p> <p>(2)品管人員學經歷登錄表(表4)。</p> <p>(3)行政院公共工程委員會認可之品管人員結業證書、回訓證明影印本(正本提出相驗)。</p> <p>(4)相關科系畢業證書影印本。</p> <p>(5)工程明細表(含品管費用)。</p> <p>三、品管人員異動時資料亦同。</p> <p>四、工程竣工後，廠商函請機關上網登錄異動解除品管人員職務。</p>					

表六

品管人員學經歷登錄表

姓 名				
出 生	年 月 日			
身分證字號				
電 話 (公)	(宅)			
通 訊 地 址				
學 歷	(科系別) 畢業			
請勾選一項 檢附資料	<input type="checkbox"/> 畢業證書 <input type="checkbox"/> 檢定合格證書			
現 職				
工作內容				
經 (按 先 後 次 序 填 寫) 歷	服務機關	擔任職務	工作內容	起訖年月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月
				年 月至 年 月

表七

經濟部水利署
廠商專任工程人員督察紀錄表 編碼：
 共二頁第一頁

工程名稱			填表日期	年 月 日	
工程主辦機關			廠 商		
一、工程督察事項		專任工程人員			
進度控制	1. 預定進度： %， 實際進度： %。 2. 工程進度概述：				
	品質管理 診察按圖施工 (營造業法第 三十五條第三 款)：	督 察 項 目	督察結果		辦理情形
合格			不 合 格		
1. 放樣工程					
2. 地質改良工程					
3. 假設工程(含施工架)					
4. 基礎工程					
5. 模板工程					
6. 混凝土工程					
7. 鋼筋(構)工程					
8. 基地環境雜項工程					
9. 主要設備工程					
10. 其他					
施工技術	施工技術指導及施工安全、解決施工技術問題概況(營造業法第三條第九款、第三十五條第三款)				
勞安環保	施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(含依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況)(營造業法第三十五條第四、第三十七條、第三十八條)				
其 他	其他依法令及契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形(如查核施工計畫等)：				

二、督察結果：

不 符 合 事 項	專任工程人員簽名： 限期改善完成日期：	工地負責人簽名：
原 因 分 析 、 矯 正 及 預 防 措 施	原因分析： 矯正措施(檢附前中後照片、相關文件)： 預防措施： 工地負責人簽名： 完成日期：	
結 案 審 查 意 見	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 說明： 專任工程人員簽名： 審查日期：	

註：

1. 本表欄位不符使用時，以附件形式說明。
2. 本表填報時機如下：(1) 公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題(2) 專任工程人員依營造業法第三十五條第三款規定督察按圖施工時。(3) 各機關關於契約中約定。
3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。
4. 公共工程屬建築物者，請依內政部 99 年 2 月 5 日台內營字第 0990800804 號令頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

表八 廠商專任工程人員督察紀錄追蹤管制表

工程名稱：

督察紀錄表 編號	督察日期	改善及矯正預防措 施完成期限	預定 追蹤日期	結案日期

表九 檢驗申請表

編碼：

工程名稱	申請日期：年月日
主辦機關	
監造單位	
廠商	
檢驗項目	
依據規定	
檢驗位置	
預定期 取樣 / 檢驗時間	* 年月日時
樣品名稱	
樣品數量	
實驗室	*
備註	<p>1.依需求欄位填寫；”*”欄位由<u>監造單位</u>填寫，其餘欄位由廠商填寫。</p> <p>2.施工機具設備查驗、材料設備檢驗、施工品質檢驗、隱蔽部位查驗、重要施工工作業檢查及其他規定項目由廠商提出申請。</p> <p>3.各項工程使用材料設備及施工成品之試驗應由符合 CNS 17025 (ISO/IEC 17025) 規定及依標準法授權之實驗室認證機構認可之實驗室辦理，並出具試驗報告。</p> <p>4.測量作業之檢查應於 24 小時前提出申請，其餘之施工作業檢查申請應於檢驗(查)前 4 小時前提出申請。</p> <p>5.本申請表由廠商填具一式二份送請監造單位，由監造單位執行檢查；由監造單位及廠商各存一份。</p>

廠商：

監造單位：

表十

不符合事項報告

編碼：

工程名稱		檢查日期	年月日
主辦機關			
監造單位			
廠商			
檢查位置		檢查人員	
檢查項目類別	<input type="checkbox"/> 1. 施工設備 <input type="checkbox"/> 2. 材料設備 <input type="checkbox"/> 3. 施工成品 <input type="checkbox"/> 4. 施工作業 <input type="checkbox"/> 5. 文件、紀錄		
不符合事項分類	<input type="checkbox"/> 1. 主要不符合事項 <input type="checkbox"/> 2. 次要不符合事項 <input type="checkbox"/> 3. 觀察事項		
不 符 合 事 項 說 明			
不符合事項(檢查者填寫)	限期改善完成日期：		
責任者：			
矯正、原因分析及預防措施情形說明			
原因分析(責任者填寫)			
矯正措施(責任者填寫)			
預防措施(責任者填寫)			
責任者：		改善完成日期：	
審核結果			
<input type="checkbox"/> 需改善			
計畫追蹤日期：			
追蹤行動內容：			
(原因分析以附件型式附於本報告)	檢查人員：	日期：	
<input type="checkbox"/> 同意結案			
結案日期：	檢查人員：		
註：1. 經檢查如有不符合事時，除填寫不符合事項說明外，並應填寫不符合事項追蹤管制表實施管制。 2. 檢查人員就責任者填報矯正及預防措施情形說明進行審核，如不符合矯正及預防措施未完善，則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容，通知責任者改善，責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核。 3. 矯正完成後應檢附改善之前中後照片並就照片內容作簡要說明。			

改善照片

(改善前中後同一角度)

編號：


工程名稱：	
說明： (改善前)	
說明： (改善中)	
說明： (改善後)	

表十一

不符合事項追蹤管制表

工程名稱：

編碼：

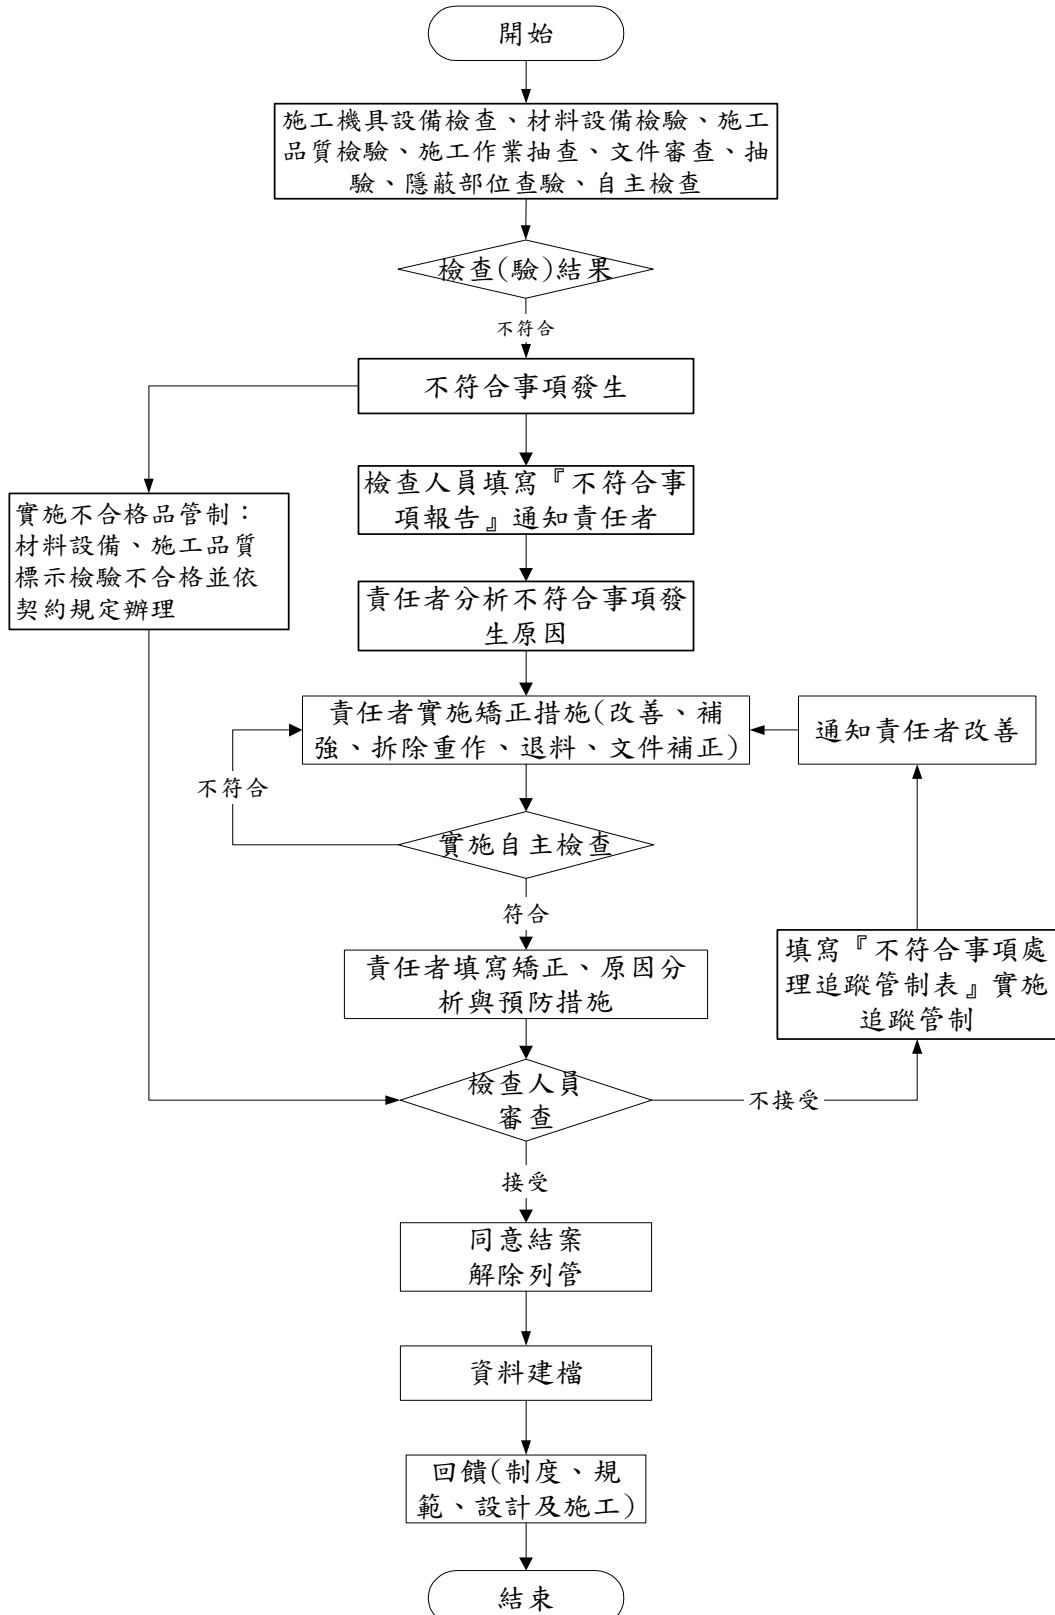

圖一 不符合事項處理流程圖

附件一**品質計畫書格式：(參考如下)****1、封面**

.....工程
品質計畫書
(版次)

主辦機關：

監造單位：

承攬廠商：


中 華 民 國 年 月

2、第一頁：品質計畫書送審簽署表

品質計畫書
送審核簽署表

工程名稱：

契約編號：

承攬廠商	提報版次：	簽署欄(含日期)
	提報日期：年 月 日	品管人員：
	廠商名稱：	工地主任： (工地負責人)
	用印： 	專任工程人員：
(委託)監造單位	審查結果： <input type="checkbox"/> 認可 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	審查人員： 專業技師： (簽証技師)
	審查結果： <input type="checkbox"/> 核定 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	審查人員：
主辦機關	審查結果： <input type="checkbox"/> 核定 <input type="checkbox"/> 退回修正 <input type="checkbox"/> 原則同意	審查人員：

附件二

試驗報告判定戳章樣式

試驗報告判定審核章
<u>設計、規範值：</u>
廠商初判人員簽名： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 本件業經核對無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任
監造單位複判人員簽名： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

附件三

品質成果報告書格式：(參考如下)

1、封面

.....工程

品質成果報告書

主辦機關：

監造單位：

承攬廠商：

中 華 民 國 年 月

2、第一頁：品質成果報告書檢核表

項 目	廠 商		監 造 單 位		備 註
	符 合	不 符 合	符 合	不 符 合	
1.報告書格式、章節適當性，內容完整性					
2.材料設備檢驗管制總表、材料設備(送審)管制總表是否符合					
3.是否有自主檢查成果統計總表。					
4.混凝土圓柱試體評估表是否符合					
5.鑽心試驗紀錄表是否符合					
6.其他各項試驗紀錄是否有總表及試驗報告					
7.材料設備出廠證明是否完整及判讀確定					
8.檢驗不符合處理情形					
9.不符合事項報告內容是否完整					
廠 商	監 造 單 位 (工務所)	主 工	辦 務	機 主	關 管

3、第二頁：目錄

目錄	頁碼
壹、工程概述 · · · · ·	· · · · ·
貳、品質管制執行過程簡述 · · · · ·	· · · · ·
參、檢討與建議 · · · · ·	· · · · ·
肆、材料設備檢驗管制總表、材料設備(送審)管制總表、 · · · · ·	· · · · ·
伍、自主檢查成果統計總表 · · · · ·	· · · · ·
陸、不符合事項處理 · · · · ·	· · · · ·
柒、混凝土圓柱試體評估表、鑽心試驗紀錄表(含試驗報告) · · · · ·	· · · · ·
捌、其他各項試驗紀錄統計表(含土方密度試驗、鋼筋試驗...等試驗報告) · · ·	· · ·
玖、材料設備出廠證明 · · · · ·	· · · · ·

- 註：1、工程概述內容包括：工程名稱、主辦及執行機關、設計單位及設計人員
、監造單位及監造人員、廠商與專任工程人員及品管人員(含異動情形)
、工程地點、開工及預定完工日期、竣工日期、工程規模概述、契約金額及品質管制作業費、工程項目數量表及應檢驗項目決算數量表等。
- 2、材料設備檢驗管制總表(如本規定表二)、材料設備(送審)管制總表(如本規定表一)。
- 3、自主檢查成果統計總表(如本規定表三)。自主檢查表資料留存於主辦機關，不附於品質成果報告書內。
- 4、不符合事項處理內容包括：含不符合事項管制表、不符合事項報告及相關資料。
- 5、混凝土圓柱試體評估表及鑽心試驗紀錄表內容包括：試驗紀錄總表、評估表、統計分析(如個別強度試驗控制圖，五組試驗強度移動平均控制圖及十組試驗差值移動平均控制圖等)及試驗報告等。
- 6、其他各項試驗紀錄統計表內容包括：各項試驗總表(檢驗項目名稱、決算數量、檢驗次數、各次試驗值及合格判定等欄位)、統計分析及試驗報告等。
- 7、材料設備出廠證明內容包括：出原廠證明文件、材料設備之材質規格及出廠試驗報告等。
- 8、各項出廠證明、試驗報告應判定及審核。
